Unverbindlicher Ablaufplan!

Nr.	Kunde	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger
0		**Projekt Blye**	**423 Tage**	**Mi 23.04.14**	**Do 07.01.16**	
1						
2		***Vertrag wirksam/ Start Lieferzeit (CIF+Anzahlung)***	***0 Tage***	***Mi 23.04.14***	***Mi 23.04.14***	
3		**Kundenanforderungen**	**94 Tage**	**Mo 20.04.15**	**Di 01.09.15**	
4		Single Line Diagramm verfügbar (liegt vor)				
5		Strasse für Fundamentbau fertig	8 Wochen	Mo 20.04.15	Di 16.06.15	
6		Strassen und Kranstellflächen fertig (Stahlturm)	8 Wochen	Do 30.04.15	Fr 26.06.15	
7		IP Informationen für Router Bestellung	0 Tage	Mo 03.08.15	Mo 03.08.15	
8		Netzzuschaltung	0 Tage	Di 01.09.15	Di 01.09.15	
9						
10		**8x 3xM 93m**	**152 Tage**	**Mo 01.06.15**	**Do 07.01.16**	
11		**Pfahlarbeiten**	**80 Tage**	**Mo 01.06.15**	**Fr 18.09.15**	
12		WEA 8 Rüttelstopfverdichtung	10 Tage	Mo 01.06.15	Fr 12.06.15	
13		WEA 5 Rüttelstopfverdichtung	10 Tage	Mo 15.06.15	Fr 26.06.15	12
14		WEA 4 Rüttelstopfverdichtung	10 Tage	Mo 29.06.15	Fr 10.07.15	13
15		WEA 2 Rüttelstopfverdichtung	10 Tage	Mo 13.07.15	Fr 24.07.15	14
16		WEA 3 Rüttelstopfverdichtung	10 Tage	Mo 27.07.15	Fr 07.08.15	15
17		WEA 1 Rüttelstopfverdichtung	10 Tage	Mo 10.08.15	Fr 21.08.15	16
18		WEA 7 Rüttelstopfverdichtung	10 Tage	Mo 24.08.15	Fr 04.09.15	17
19		WEA 6 Rüttelstopfverdichtung	10 Tage	Mo 07.09.15	Fr 18.09.15	18
20		**Fundament**	**105 Tage**	**Fr 12.06.15**	**Fr 06.11.15**	
21		Start Fundament	0 Tage	Fr 12.06.15	Fr 12.06.15	12
22		WEA 8 Fundament	7 Wochen	Mo 15.06.15	Fr 31.07.15	21
23		WEA 5 Fundament	7 Wochen	Mo 29.06.15	Fr 14.08.15	22EA-6 Wochen;13
24		WEA 4 Fundament	7 Wochen	Mo 13.07.15	Fr 28.08.15	23EA-6 Wochen;14
25		WEA 2 Fundament	7 Wochen	Mo 27.07.15	Fr 11.09.15	24EA-6 Wochen;15
26		WEA 3 Fundament	7 Wochen	Mo 10.08.15	Fr 25.09.15	25EA-6 Wochen;16
27		WEA 1 Fundament	7 Wochen	Mo 24.08.15	Fr 09.10.15	26EA-6 Wochen;17
28		WEA 7 Fundament	7 Wochen	Mo 07.09.15	Fr 23.10.15	27EA-6 Wochen;18
29		WEA 6 Fundament	7 Wochen	Mo 21.09.15	Fr 06.11.15	28EA-6 Wochen;19
30		**Errichtung Senvion**	**65,5 Tage**	**Mo 03.08.15**	**Mo 02.11.15**	
31		Beginn Anlieferung Senvion	0 Tage	Mo 03.08.15	Mo 03.08.15	33AE-1 Woche
32		**WEA 8 Stahl Turm**	**11,5 Tage**	**Mo 10.08.15**	**Di 25.08.15**	
33		Errichtung WEA	5 Tage	Mo 10.08.15	Fr 14.08.15	
34		Kran Umbau	2,5 Tage	Mo 17.08.15	Mi 19.08.15	
35		Innenausbau	6,5 Tage	Mo 17.08.15	Di 25.08.15	
36		**WEA 5 Stahl Turm**	**11,5 Tage**	**Mi 19.08.15**	**Do 03.09.15**	
37		Errichtung WEA	5 Tage	Mi 19.08.15	Di 25.08.15	
38		Kran Umbau	2,5 Tage	Mi 26.08.15	Fr 28.08.15	
39		Innenausbau	6,5 Tage	Mi 26.08.15	Do 03.09.15	
40		**WEA 4 Stahl Turm**	**11,5 Tage**	**Fr 28.08.15**	**Mo 14.09.15**	
41		Errichtung WEA	5 Tage	Fr 28.08.15	Do 03.09.15	
42		Kran Umbau	2,5 Tage	Fr 04.09.15	Di 08.09.15	
43		Innenausbau	6,5 Tage	Fr 04.09.15	Mo 14.09.15	
44		**WEA 2 Stahl Turm**	**11,5 Tage**	**Di 08.09.15**	**Mi 23.09.15**	
45		Errichtung WEA	5 Tage	Di 08.09.15	Mo 14.09.15	
46		Kran Umbau	2,5 Tage	Di 15.09.15	Do 17.09.15	
47		Innenausbau	6,5 Tage	Di 15.09.15	Mi 23.09.15	
48		**WEA 3 Stahl Turm**	**11,5 Tage**	**Do 17.09.15**	**Fr 02.10.15**	
49		Errichtung WEA	5 Tage	Do 17.09.15	Mi 23.09.15	
50		Kran Umbau	2,5 Tage	Do 24.09.15	Mo 28.09.15	
51		Innenausbau	6,5 Tage	Do 24.09.15	Fr 02.10.15	
52		**WEA 1 Stahl Turm**	**11,5 Tage**	**Mo 28.09.15**	**Di 13.10.15**	
53		Errichtung WEA	5 Tage	Mo 28.09.15	Fr 02.10.15	
54		Kran Umbau	2,5 Tage	Mo 05.10.15	Mi 07.10.15	
55		Innenausbau	6,5 Tage	Mo 05.10.15	Di 13.10.15	
56		**WEA 7 Stahl Turm**	**11,5 Tage**	**Mi 07.10.15**	**Do 22.10.15**	
57		Errichtung WEA	5 Tage	Mi 07.10.15	Di 13.10.15	
58		Kran Umbau	2,5 Tage	Mi 14.10.15	Fr 16.10.15	
59		Innenausbau	6,5 Tage	Mi 14.10.15	Do 22.10.15	
60		**WEA 6 Stahl Turm**	**11,5 Tage**	**Fr 16.10.15**	**Mo 02.11.15**	
61		Errichtung WEA	5 Tage	Fr 16.10.15	Do 22.10.15	
62		Innenausbau	6,5 Tage	Fr 23.10.15	Mo 02.11.15	
63		**Inbetriebnahme Senvion**	**77 Tage**	**Mo 14.09.15**	**Do 07.01.16**	
64		WEA 8 IBN	6,5 Tage	Mo 14.09.15	Di 22.09.15	
65		WEA 5 IBN	6,5 Tage	Di 22.09.15	Mi 30.09.15	64
66		WEA 4 IBN	6,5 Tage	Do 01.10.15	Fr 09.10.15	65
67		WEA 2 IBN	6,5 Tage	Fr 09.10.15	Mo 19.10.15	66
68		WEA 3 IBN	6,5 Tage	Di 20.10.15	Mi 28.10.15	67
69		WEA 1 IBN	6,5 Tage	Mi 28.10.15	Do 05.11.15	68
70		WEA 7 IBN	6,5 Tage	Fr 06.11.15	Mo 16.11.15	69
71		WEA 6 IBN	6,5 Tage	Mo 16.11.15	Di 24.11.15	70
72		**Endkontrolle Senvion**	**11 Tage**	**Di 15.12.15**	**Do 07.01.16**	
73		WEA 8	1 Tag	Di 15.12.15	Di 15.12.15	
74		WEA 5	1 Tag	Mi 16.12.15	Mi 16.12.15	73
75		WEA 4	1 Tag	Do 17.12.15	Do 17.12.15	74
76		WEA 2	1 Tag	Fr 18.12.15	Fr 18.12.15	75
77		WEA 3	1 Tag	Mo 04.01.16	Mo 04.01.16	
78		WEA 1	1 Tag	Di 05.01.16	Di 05.01.16	77
79		WEA 7	1 Tag	Mi 06.01.16	Mi 06.01.16	78
80		WEA 6	1 Tag	Do 07.01.16	Do 07.01.16	79

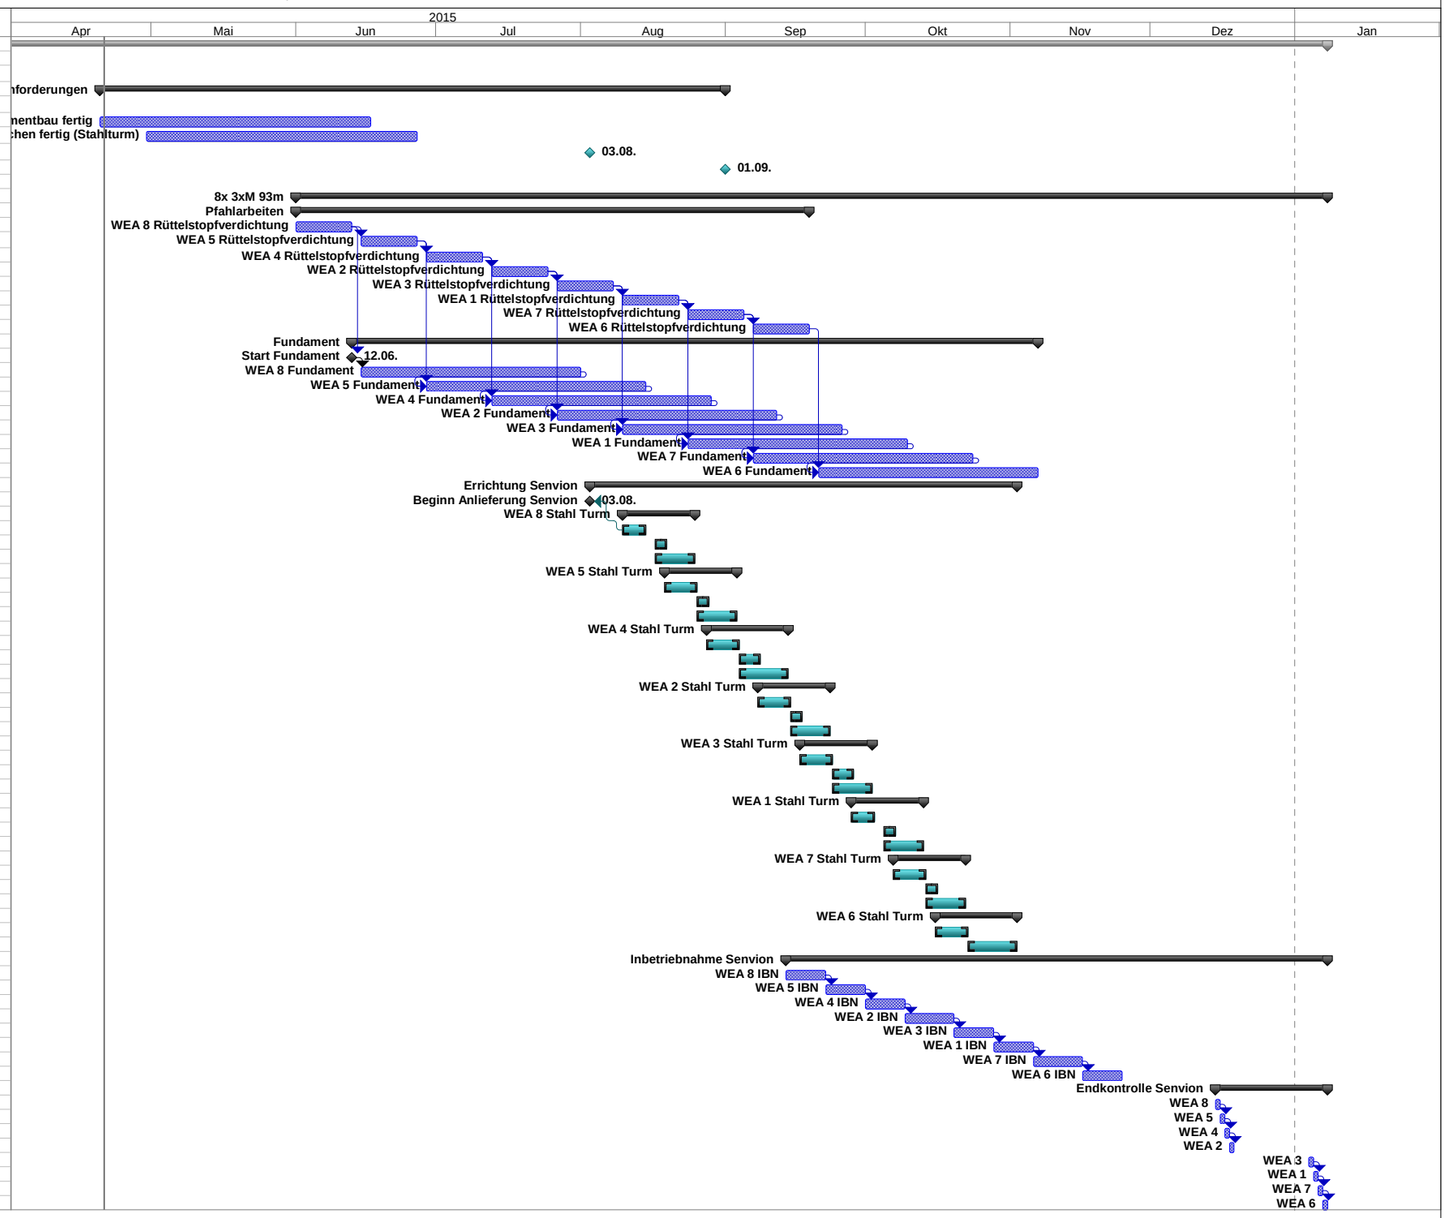

Unverbindlicher Ablaufplan!
Erstellt am: 14.04.2015
Erstellt von: Dominik Ellesser
